EARZ CIPP Construction Project

SAWS Project 04-4506

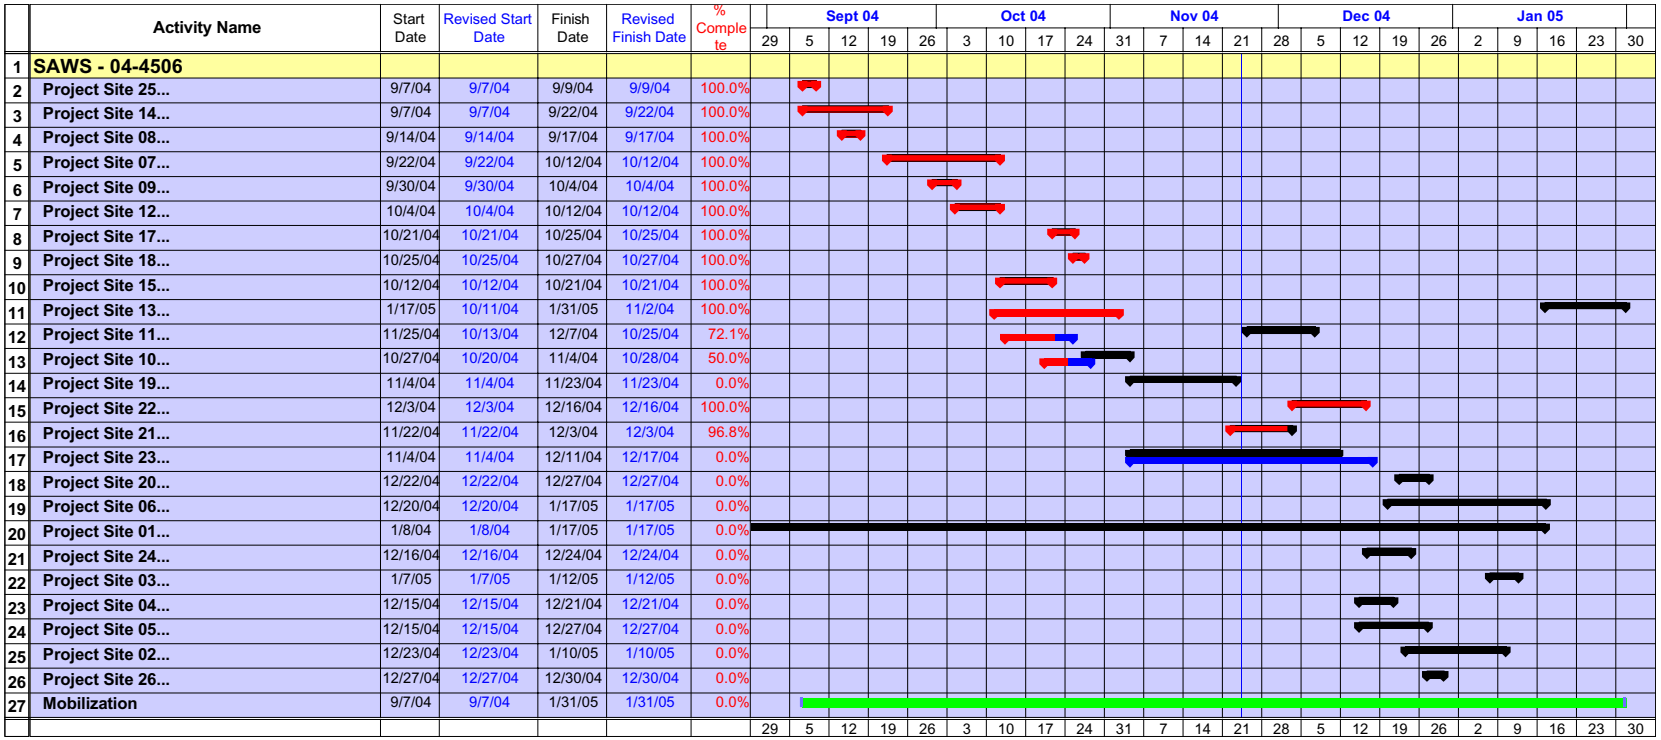

	Activity Name	Start Date	Revised Start Date	Finish Date	Revised Finish Date	% Complete
1	**SAWS - 04-4506**					
2	**Project Site 25...**	9/7/04	9/7/04	9/9/04	9/9/04	100.0%
3	**Project Site 14...**	9/7/04	9/7/04	9/22/04	9/22/04	100.0%
4	**Project Site 08...**	9/14/04	9/14/04	9/17/04	9/17/04	100.0%
5	**Project Site 07...**	9/22/04	9/22/04	10/12/04	10/12/04	100.0%
6	**Project Site 09...**	9/30/04	9/30/04	10/4/04	10/4/04	100.0%
7	**Project Site 12...**	10/4/04	10/4/04	10/12/04	10/12/04	100.0%
8	**Project Site 17...**	10/21/04	10/21/04	10/25/04	10/25/04	100.0%
9	**Project Site 18...**	10/25/04	10/25/04	10/27/04	10/27/04	100.0%
10	**Project Site 15...**	10/12/04	10/12/04	10/21/04	10/21/04	100.0%
11	**Project Site 13...**	1/17/05	10/11/04	1/31/05	11/2/04	100.0%
12	**Project Site 11...**	11/25/04	10/13/04	12/7/04	10/25/04	72.1%
13	**Project Site 10...**	10/27/04	10/20/04	11/4/04	10/28/04	50.0%
14	**Project Site 19...**	11/4/04	11/4/04	11/23/04	11/23/04	0.0%
15	**Project Site 22...**	12/3/04	12/3/04	12/16/04	12/16/04	100.0%
16	**Project Site 21...**	11/22/04	11/22/04	12/3/04	12/3/04	96.8%
17	**Project Site 23...**	11/4/04	11/4/04	12/11/04	12/17/04	0.0%
18	**Project Site 20...**	12/22/04	12/22/04	12/27/04	12/27/04	0.0%
19	**Project Site 06...**	12/20/04	12/20/04	1/17/05	1/17/05	0.0%
20	**Project Site 01...**	1/8/04	1/8/04	1/17/05	1/17/05	0.0%
21	**Project Site 24...**	12/16/04	12/16/04	12/24/04	12/24/04	0.0%
22	**Project Site 03...**	1/7/05	1/7/05	1/12/05	1/12/05	0.0%
23	**Project Site 04...**	12/15/04	12/15/04	12/21/04	12/21/04	0.0%
24	**Project Site 05...**	12/15/04	12/15/04	12/27/04	12/27/04	0.0%
25	**Project Site 02...**	12/23/04	12/23/04	1/10/05	1/10/05	0.0%
26	**Project Site 26...**	12/27/04	12/27/04	12/30/04	12/30/04	0.0%
27	**Mobilization**	9/7/04	9/7/04	1/31/05	1/31/05	0.0%
